

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	0日	三	四	五	六	日	2018年12月17日	一	二	三	四
1	启动	3 个工作日	2018年12月13	2018年12月15													
2	组建核心团队	1 个工作日	2018年12月13	2018年12月13		项目经理, UI专家											
3	干系人分析	1 个工作日	2018年12月13	2018年12月13		项目经理											
4	里程碑计划	1 个工作日	2018年12月13	2018年12月13		项目经理											
5	制定项目章程	1 个工作日	2018年12月14	2018年12月14	2, 3, 4	项目经理											
6	项目启动大会	1 个工作日	2018年12月17	2018年12月17	5	项目经理, 需求专家											
7	规划	17 个工作日	2018年12月18	2019年1月9日													
8	规划范围	4 个工作日	2018年12月18	2018年12月21													
9	制定需求说明书	1 个工作日	2018年12月18	2018年12月18	6	需求专家											
10	界面设计	1 个工作日	2018年12月19	2018年12月19		UI专家											
11	详细设计说明书	1 个工作日	2018年12月19	2018年12月19		设计专家											
12	范围说明书	1 个工作日	2018年12月19	2018年12月19		项目经理											
13	创建WBS	1 个工作日	2018年12月20	2018年12月20	10, 11, 12	项目经理											
14	形成范围基准	1 个工作日	2018年12月21	2018年12月21	13	项目经理											
15	规划时间	5 个工作日	2018年12月24	2018年12月28													
16	排列工作包顺序	1 个工作日	2018年12月24	2018年12月24	14	项目经理											
17	估算时间	1 个工作日	2018年12月25	2018年12月25	16	项目经理											
18	估算持续时间	1 个工作日	2018年12月26	2018年12月26	17	项目经理											
19	制定进度计划	1 个工作日	2018年12月27	2018年12月27	18	项目经理											
20	形成进度基准	1 个工作日	2018年12月28	2018年12月28	19	项目经理											
21	规划成本	3 个工作日	2019年1月1日	2019年1月3日													
22	项目成本估算	1 个工作日	2018年12月31	2018年12月31	20	项目经理											
23	项目预算	1 个工作日	2019年1月1日	2019年1月1日	22	项目经理											
24	形成范围基准	1 个工作日	2019年1月2日	2019年1月2日	23	项目经理											
25	规划质量	2 个工作日	2018年12月24	2018年12月26													
26	制定测试计划	1 个工作日	2018年12月24	2018年12月24	14	质量专家											
27	制定测试用例	1 个工作日	2018年12月25	2018年12月25	26	质量专家											
28	规划人力资源	2 个工作日	2018年12月26	2018年12月28													
29	制定人力资源计划	1 个工作日	2018年12月26	2018年12月26	17	项目经理											
30	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2018年12月27	2018年12月27	29	项目经理											
31	规划沟通	1 个工作日	2018年12月28	2018年12月28													
32	制定沟通管理计划	1 个工作日	2018年12月28	2018年12月28	30	项目经理											
33	规划采购	2 个工作日	2018年12月26	2018年12月28													

项目： 所及WBS

日期： 2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◇

↓

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	0日	三	四	五	六	日	2018年12月17日	一	二	三	四
34	自制外购分析	1 个工作日	2018年12月26	2018年12月26	17	项目经理											
35	制定采购文件	1 个工作日	2018年12月27	2018年12月27	34	项目经理											
36	规划风险	3 个工作日	2019年1月4日	2019年1月8日													
37	识别风险	1 个工作日	2019年1月4日	2019年1月4日	15, 21, 25, 28	项目经理											
38	风险分析	1 个工作日	2019年1月5日	2019年1月5日	37	项目经理											
39	制定风险登记册	1 个工作日	2019年1月8日	2019年1月8日	38	项目经理											
40	规划整合	1 个工作日	2019年1月9日	2019年1月9日	39	项目经理											
41	执行与监控	13 个工作日	2019年1月10日	2019年1月28													
42	组建项目团队	1 个工作日	2019年1月10日	2019年1月10	7	项目经理, 测试员											
43	项目执行	8 个工作日	2019年1月11日	2019年1月22													
44	用户模块	8 个工作日	2019年1月11日	2019年1月22													
45	注册登录	1 个工作日	2019年1月11日	2019年1月11	42	程序员1											
46	首页	1 个工作日	2019年1月14日	2019年1月14	45	程序员1											
47	探索	1 个工作日	2019年1月15日	2019年1月15	45	程序员1											
48	消息	1 个工作日	2019年1月16日	2019年1月16	45	程序员1											
49	个人中心	1 个工作日	2019年1月17日	2019年1月17	45	程序员1											
50	发布	1 个工作日	2019年1月18日	2019年1月18	45	程序员1											
51	浏览	1 个工作日	2019年1月21日	2019年1月21	45	程序员1											
52	门票购买	1 个工作日	2019年1月22日	2019年1月22	45	程序员1											
53	管理员模块	6 个工作日	2019年1月11日	2019年1月18													
54	内容监督	1 个工作日	2019年1月11日	2019年1月11	42	程序员2											
55	数据统计分析	1 个工作日	2019年1月14日	2019年1月14	54	程序员2											
56	活动推送	1 个工作日	2019年1月15日	2019年1月15	54	程序员2											
57	每日推荐	1 个工作日	2019年1月16日	2019年1月16	54	程序员2											
58	门票上架	1 个工作日	2019年1月17日	2019年1月17	54	程序员2											
59	门票订单处理	1 个工作日	2019年1月18日	2019年1月18	54	程序员2											
60	项目监控	3 个工作日	2019年1月23日	2019年1月25													
61	各项指标监控	1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23	42	测试员1, 测试员											
62	监控评审	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24	61	设计专家, 项目经											
63	变更评审	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25	62	设计专家, 项目经											
64	例会	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25	42	UI专家, 测试员1											
65	管理干系人	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25													
66	发布项目信息	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25	42	项目经理											

项目： 所及WBS

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限


进度

手动进度

◇

↓

标识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	0日	三	四	五	六	日	2018年12月17日	一	二	三	四
67		报告监控指标	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日	42	项目经理											
68		干系人沟通	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日	42	项目经理											
69		团队建设	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日													
70		培训	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日	42	UI专家, 测试员1											
71		娱乐活动	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日	42	UI专家, 测试员1											
72		沟通	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日	42	UI专家, 测试员1											
73		采购	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日	42	项目经理											
74		项目验收	1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日	43	UI专家, 设计专家											
75		收尾	1 个工作日	2019年1月29日	2019年1月29日													
76		项目终验	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日	74	UI专家, 设计专家											
77		结束采购	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日	74	项目经理											
78		项目内部收尾	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日	74	UI专家, 测试员1											



项目：所及WBS

日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要
















非活动任务


非活动里程碑 


非活动摘要 


手动任务 


仅工期 


手动摘要总成 


手动摘要 


仅开始时间 


仅完成时间 


外部任务 

外部里程碑 


最后期限 


进度 


手动进度 

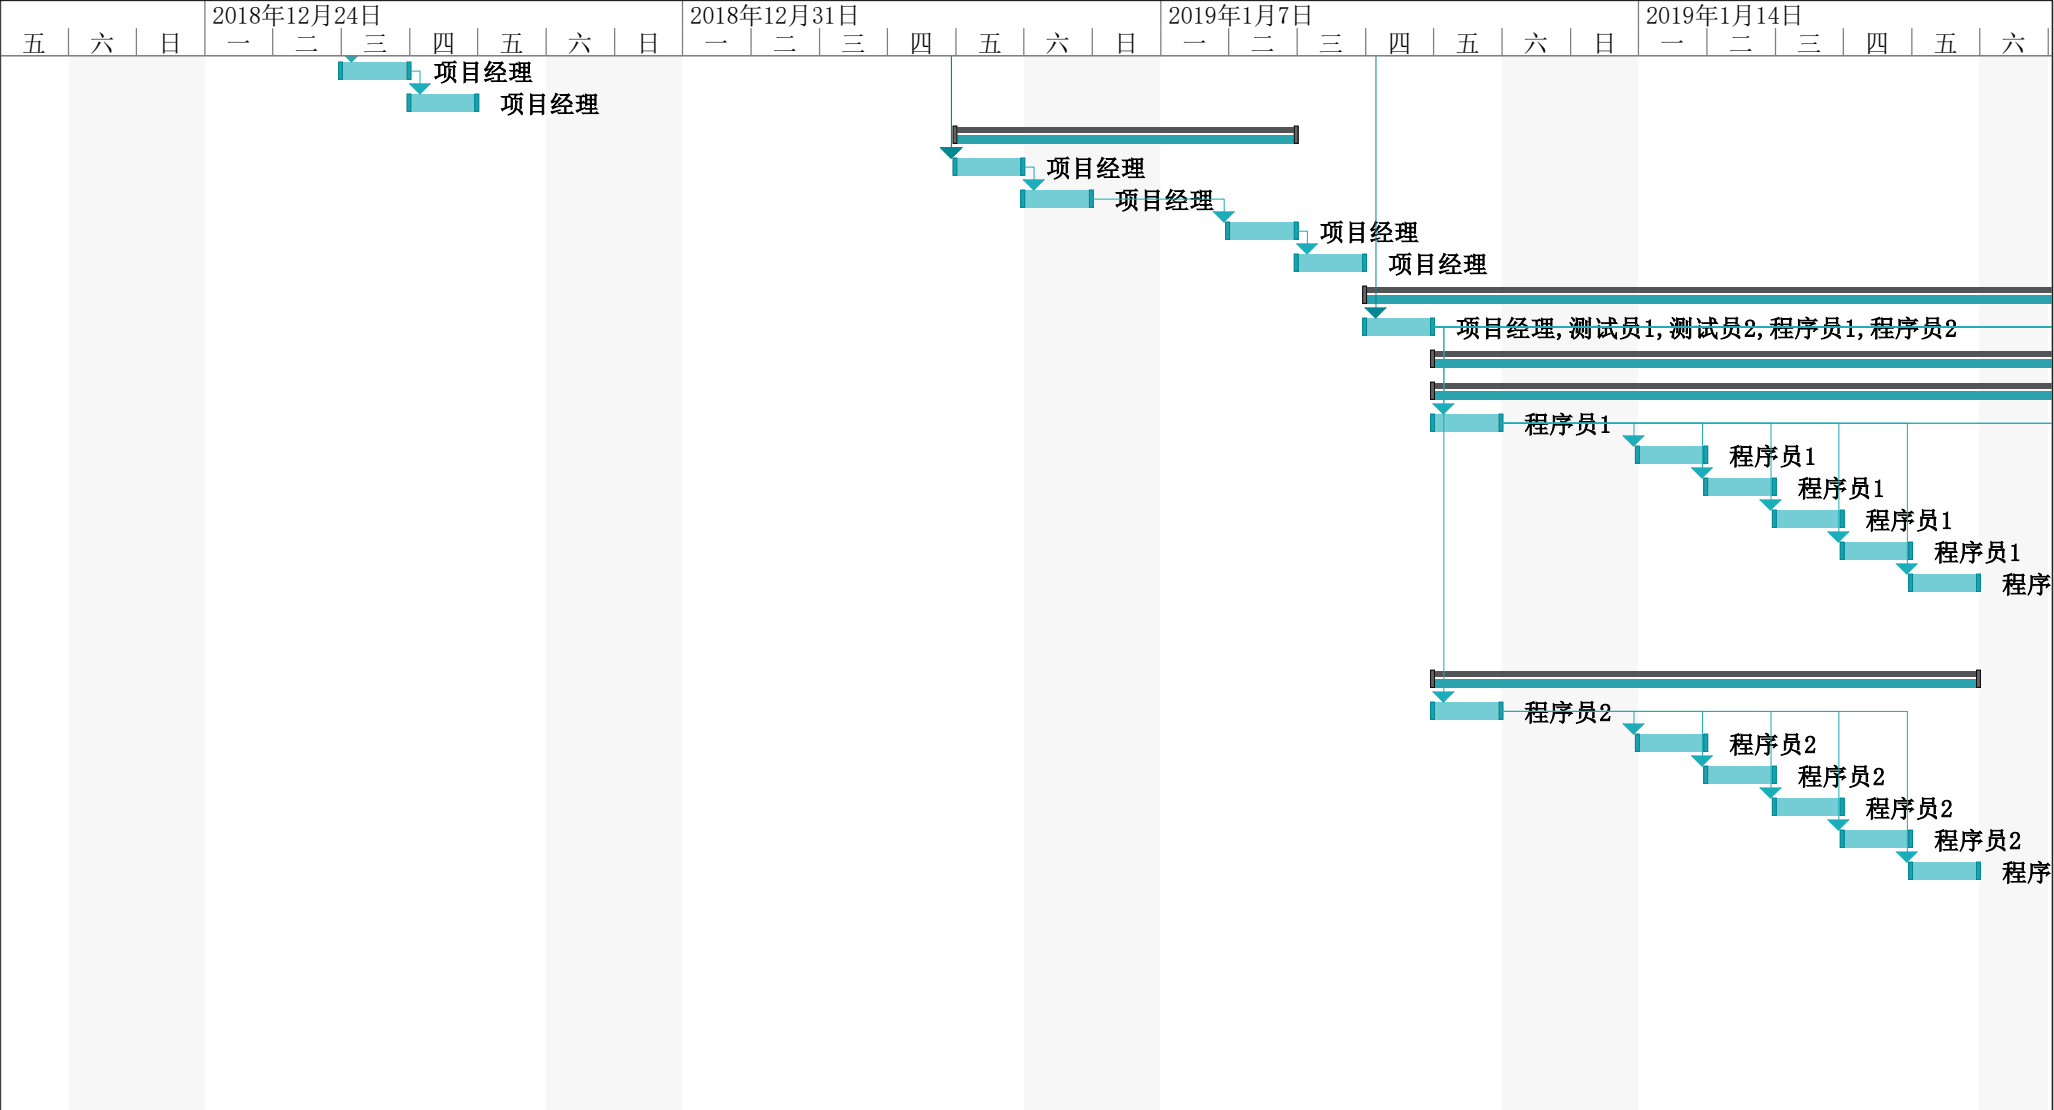

项目：所及WBS 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



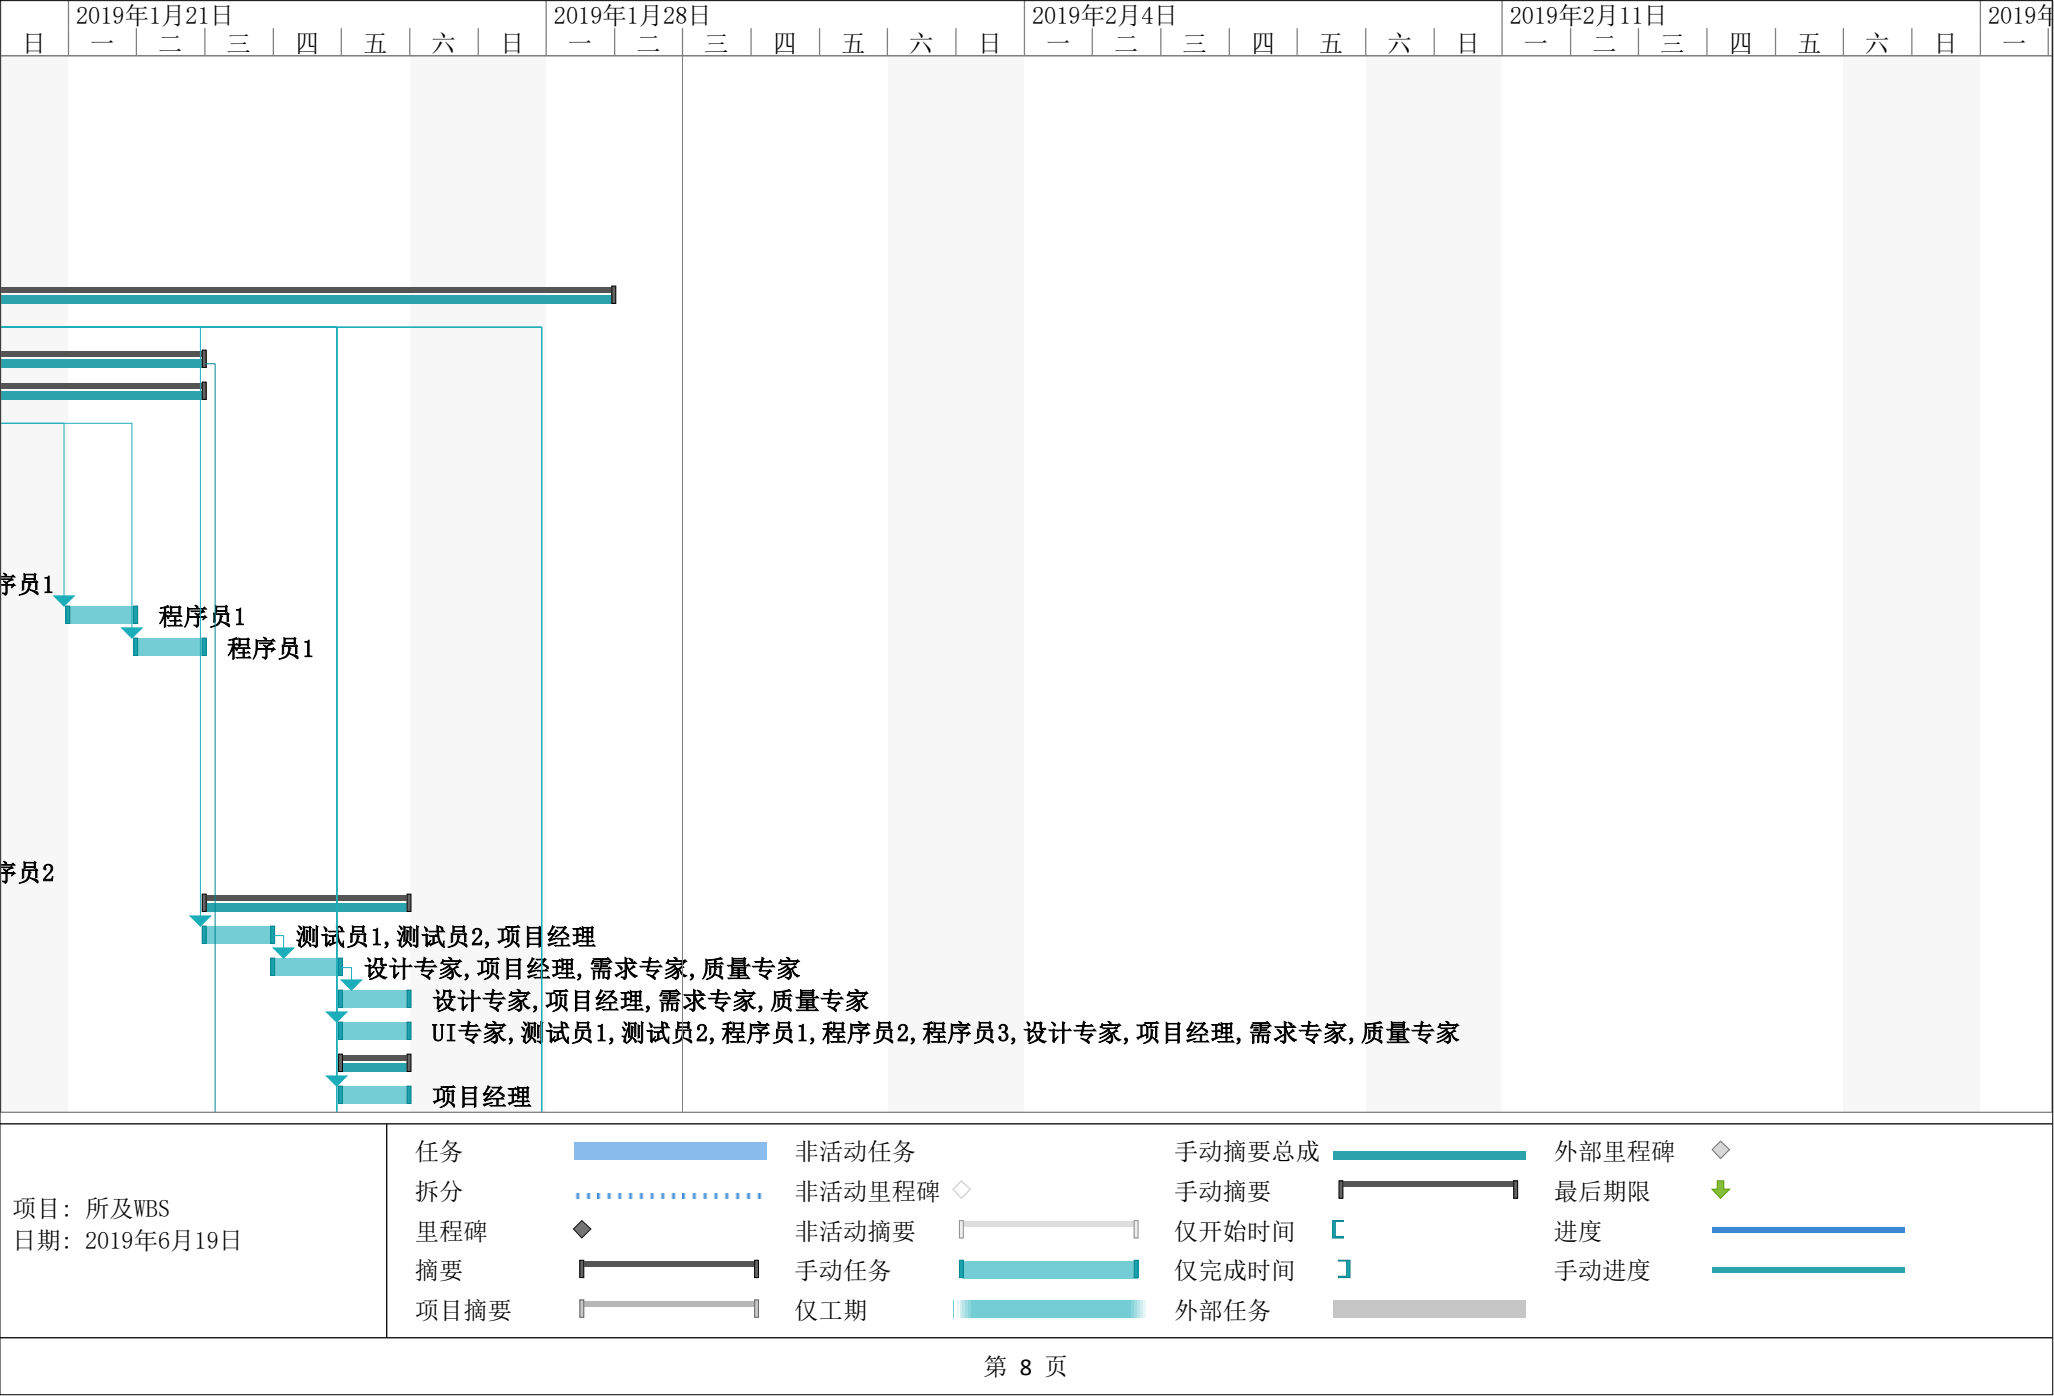

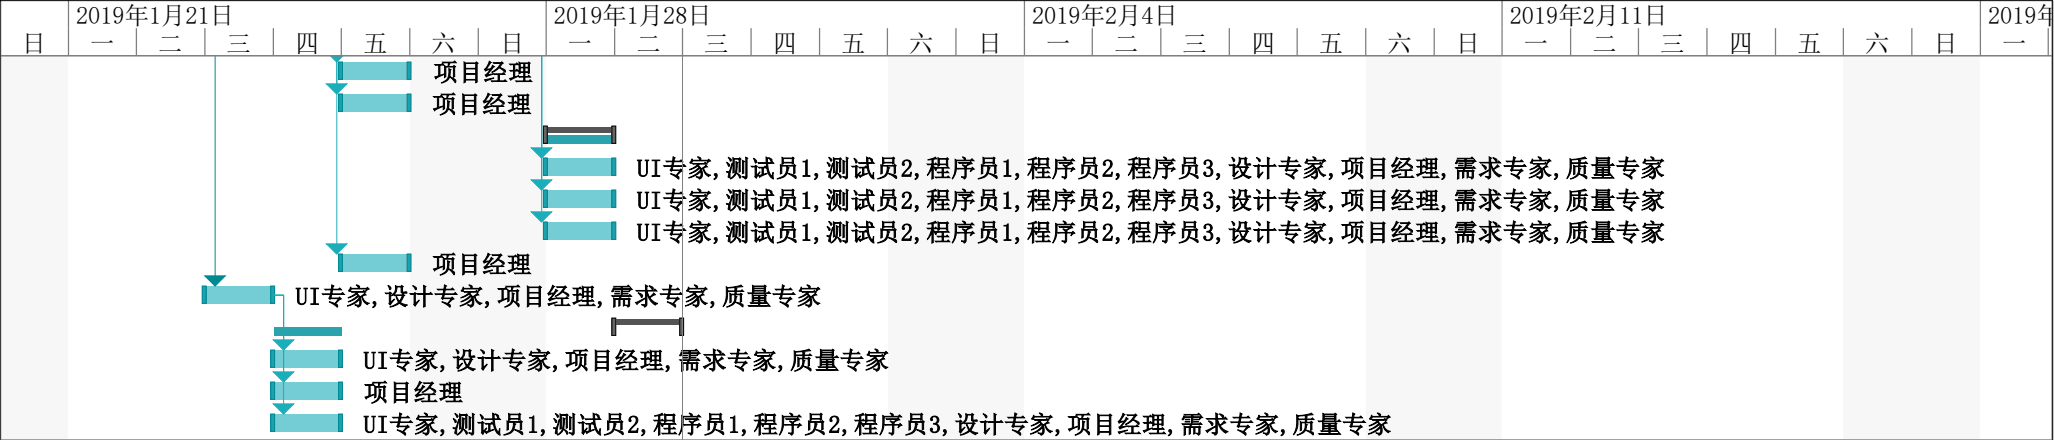

项目：所及WBS 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			
