


































标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2月10日						2018年12月17		
							三	四	五	六	日	一	二	三	
1	启动	3 个工作日	2018年12月13日	2018年12月17日											
2	组建核心团队	1 个工作日	2018年12月13日	2018年12月13日		项目经理									
3	干系人分析	1 个工作日	2018年12月13日	2018年12月13日		项目经理[50%]									
4	里程碑计划	1 个工作日	2018年12月13日	2018年12月13日											
5	制定项目章程	1 个工作日	2018年12月14日	2018年12月14日	2, 3, 4										
6	项目启动大会	1 个工作日	2018年12月17日	2018年12月17日	5										
7	规划	17 个工作日	2018年12月18日	2019年1月9日											
8	规划范围	4 个工作日	2018年12月18日	2018年12月21日											
9	制定需求说明书	1 个工作日	2018年12月18日	2018年12月18日	6										
10	界面设计	1 个工作日	2018年12月19日	2018年12月19日	9										
11	详细设计说明书	1 个工作日	2018年12月19日	2018年12月19日	9										
12	范围说明书	1 个工作日	2018年12月19日	2018年12月19日	9										
13	创建WBS	1 个工作日	2018年12月20日	2018年12月20日	10, 11, 12										
14	形成范围基准	1 个工作日	2018年12月21日	2018年12月21日	13										
15	规划时间	5 个工作日	2018年12月24日	2018年12月28日											
16	排列工作包顺序	1 个工作日	2018年12月24日	2018年12月24日	14										
17	估算时间	1 个工作日	2018年12月25日	2018年12月25日	16										
18	估算持续时间	1 个工作日	2018年12月26日	2018年12月26日	17										
19	制定进度计划	1 个工作日	2018年12月27日	2018年12月27日	18										
20	形成进度基准	1 个工作日	2018年12月28日	2018年12月28日	19										
21	规划成本	3 个工作日	2019年1月1日	2019年1月3日											
22	项目成本估算	1 个工作日	2018年12月31日	2018年12月31日	20										
23	项目预算	1 个工作日	2019年1月1日	2019年1月1日	22										
24	形成范围基准	1 个工作日	2019年1月2日	2019年1月2日	23										
25	规划质量	2 个工作日	2018年12月24日	2018年12月25日											
26	制定测试计划	1 个工作日	2018年12月24日	2018年12月24日	14										
27	制定测试用例	1 个工作日	2018年12月25日	2018年12月25日	26										
28	规划人力资源	2 个工作日	2018年12月26日	2018年12月27日											
29	制定人力资源计划	1 个工作日	2018年12月26日	2018年12月26日	17										
30	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2018年12月27日	2018年12月27日	29										
31	规划沟通	1 个工作日	2018年12月28日	2018年12月28日											
32	制定沟通管理计划	1 个工作日	2018年12月28日	2018年12月28日	30										
33	规划采购	2 个工作日	2018年12月26日	2018年12月27日											

项目：所及WBS.mpp
日期：2019年6月19日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2月10日					2018年12月17		
							三	四	五	六	日	一	二	三
34	自制外购分析	1 个工作日	2018年12月26日	2018年12月26日	17									
35	制定采购文件	1 个工作日	2018年12月27日	2018年12月27日	34									
36	规划风险	3 个工作日	2019年1月4日	2019年1月8日										
37	识别风险	1 个工作日	2019年1月4日	2019年1月4日	15, 21, 25, 28									
38	风险分析	1 个工作日	2019年1月5日	2019年1月5日	37									
39	制定风险登记册	1 个工作日	2019年1月8日	2019年1月8日	38									
40	规划整合	1 个工作日	2019年1月9日	2019年1月9日	39									
41	执行与监控	13 个工作日	2019年1月10日	2019年1月28日										
42	组建项目团队	1 个工作日	2019年1月10日	2019年1月10日	7									
43	项目执行	8 个工作日	2019年1月11日	2019年1月22日										
44	用户模块	8 个工作日	2019年1月11日	2019年1月22日										
45	注册登录	1 个工作日	2019年1月11日	2019年1月11日	42									
46	首页	1 个工作日	2019年1月14日	2019年1月14日	45									
47	探索	1 个工作日	2019年1月15日	2019年1月15日	45									
48	消息	1 个工作日	2019年1月16日	2019年1月16日	45									
49	个人中心	1 个工作日	2019年1月17日	2019年1月17日	45									
50	发布	1 个工作日	2019年1月18日	2019年1月18日	45									
51	浏览	1 个工作日	2019年1月21日	2019年1月21日	45									
52	门票购买	1 个工作日	2019年1月22日	2019年1月22日	45									
53	管理员模块	6 个工作日	2019年1月11日	2019年1月18日										
54	内容监督	1 个工作日	2019年1月11日	2019年1月11日	42									
55	数据统计分析	1 个工作日	2019年1月14日	2019年1月14日	54									
56	活动推送	1 个工作日	2019年1月15日	2019年1月15日	54									
57	每日推荐	1 个工作日	2019年1月16日	2019年1月16日	54									
58	门票上架	1 个工作日	2019年1月17日	2019年1月17日	54									
59	门票订单处理	1 个工作日	2019年1月18日	2019年1月18日	54									
60	项目监控	3 个工作日	2019年1月23日	2019年1月25日										
61	各项指标监控	1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日	42									
62	监控评审	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日	61									
63	变更评审	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日	62									
64	例会	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日	42									
65	管理干系人	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日										
66	发布项目信息	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日	42									

项目： 所及WBS. mpp

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑


最后期限


进度


手动进度





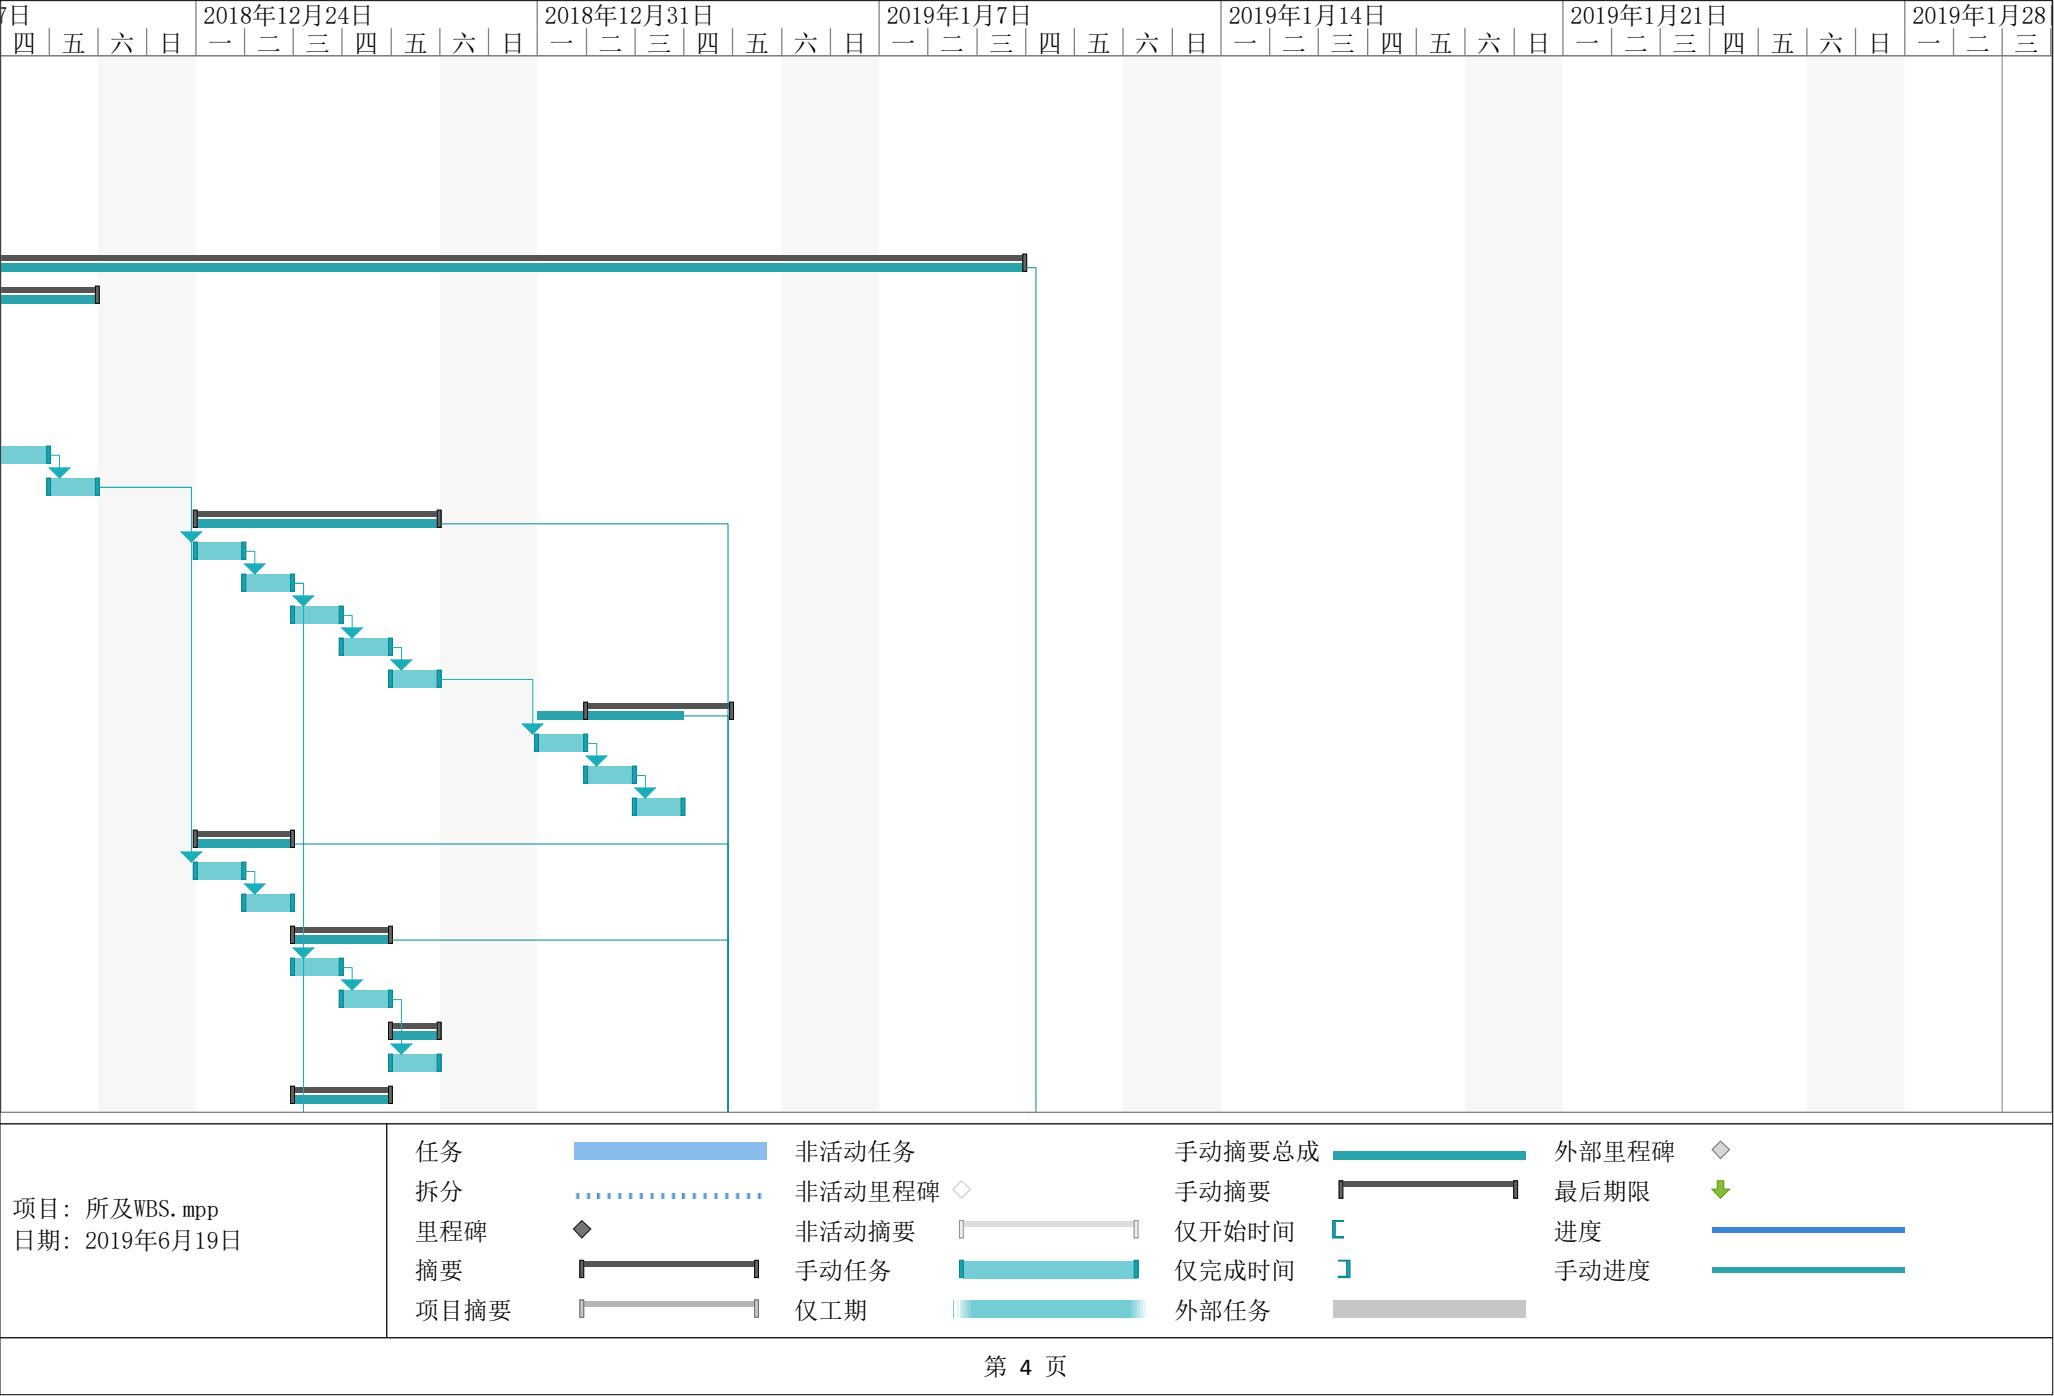

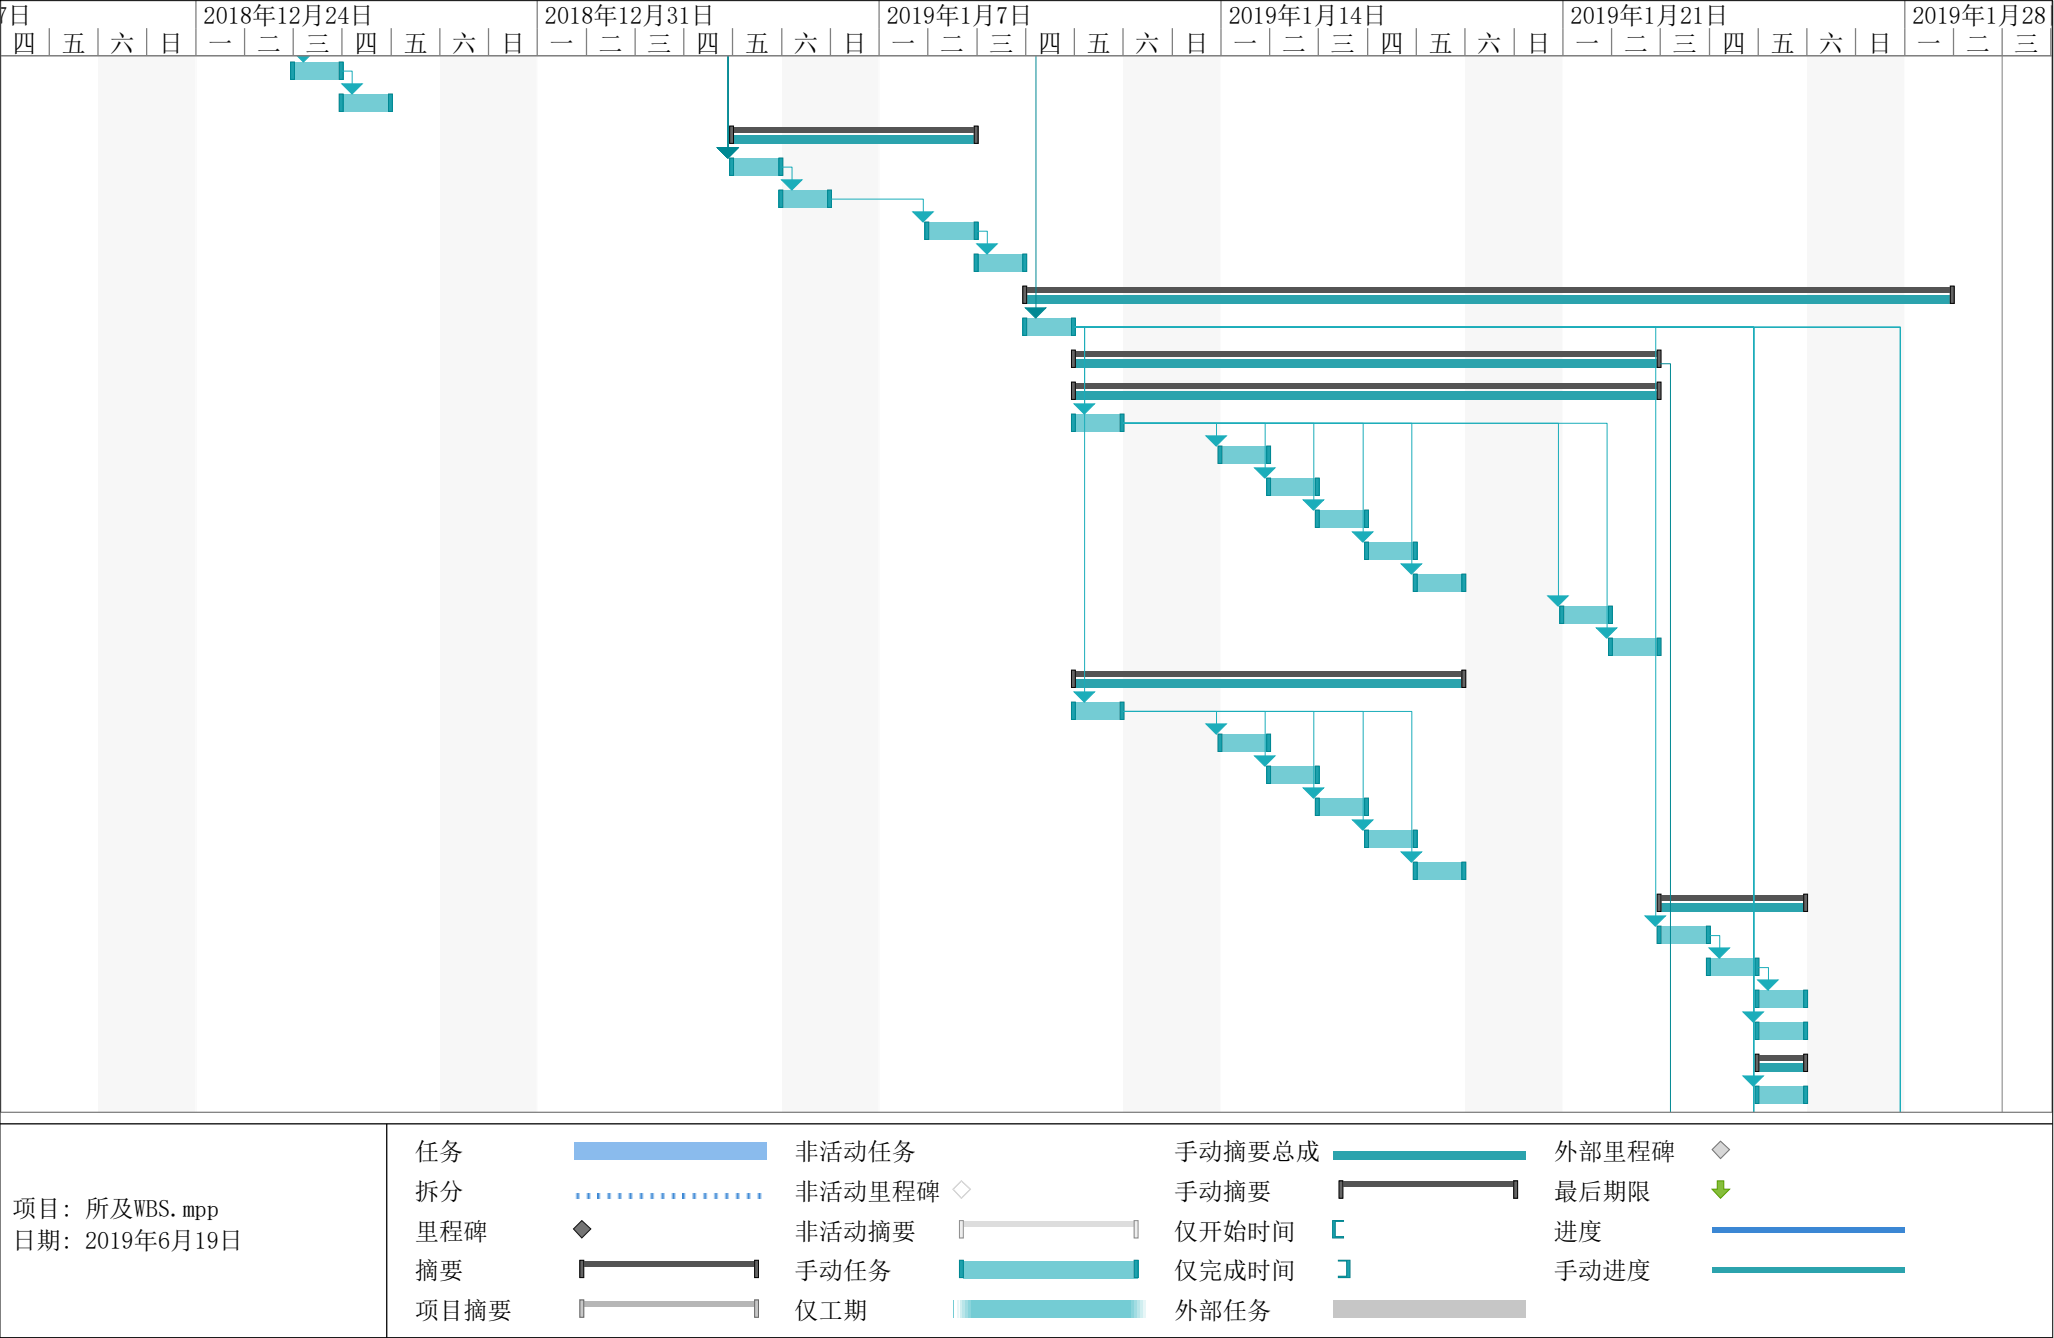











◇

↓







项目：所及WBS. mpp 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	
